Erweiterungsneubau Burgschule Linden

Rohbau

12.06.2026

LKG
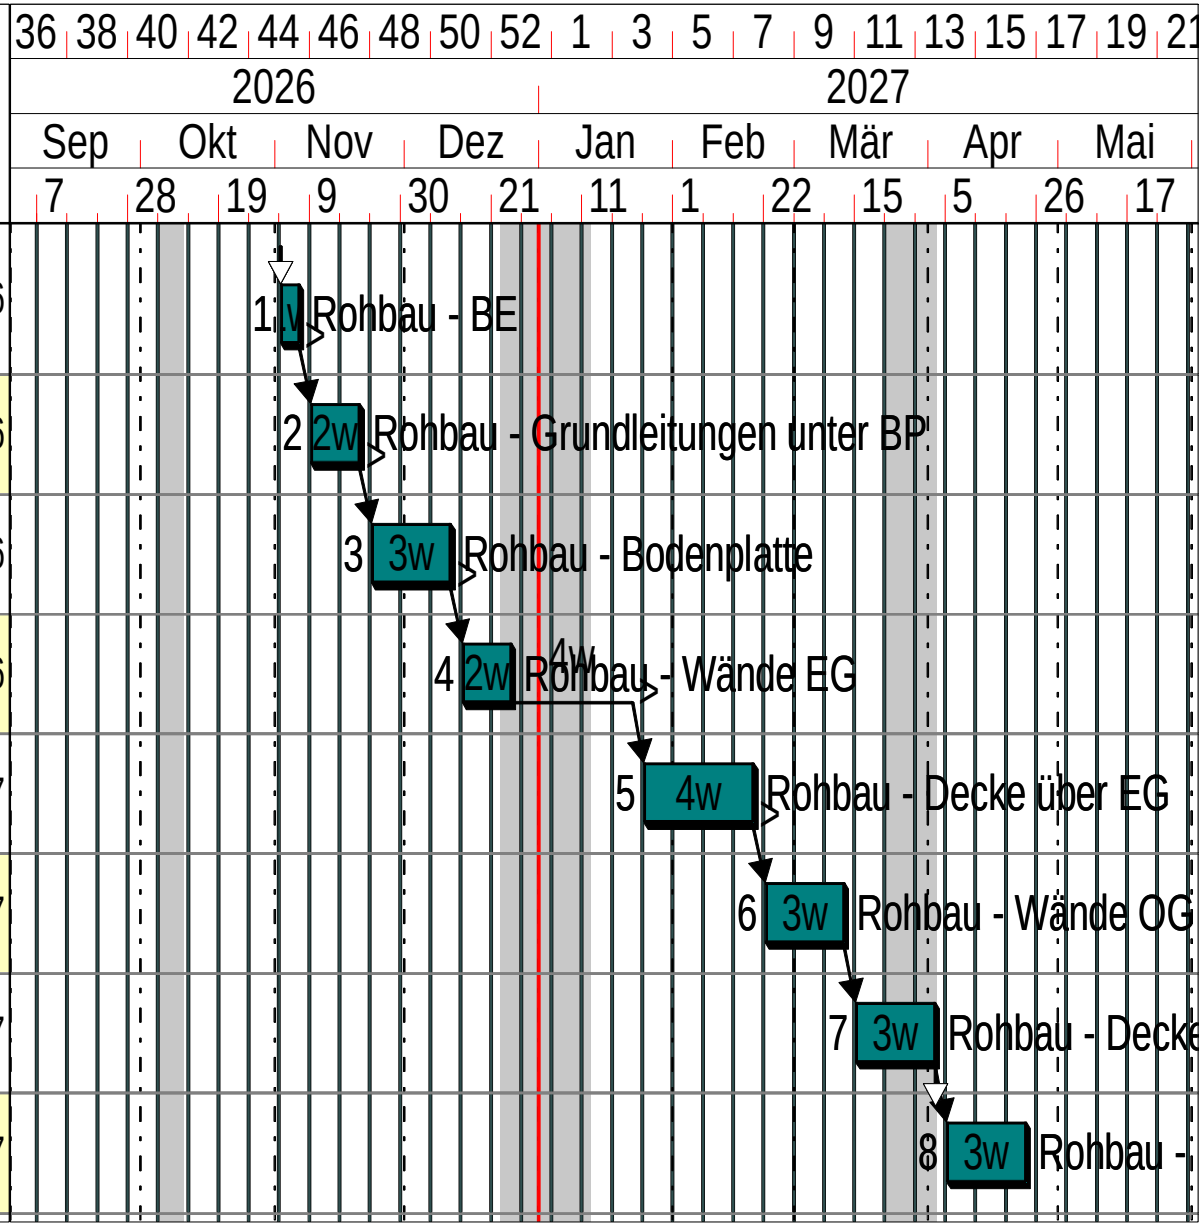
Nr.	Bezeichnung	Start	Dauer	Ende
1	Rohbau - BE	02.11.2026	1w	06.11.2026
2	Rohbau - Grundleitungen unter BP	09.11.2026	2w	20.11.2026
3	Rohbau - Bodenplatte	23.11.2026	3w	11.12.2026
4	Rohbau - Wände EG	14.12.2026	2w	25.12.2026
5	Rohbau - Decke über EG	25.01.2027	4w	19.02.2027
6	Rohbau - Wände OG	22.02.2027	3w	12.03.2027
7	Rohbau - Decke über OG	15.03.2027	3w	02.04.2027
8	Rohbau - Restarbeiten	05.04.2027	3w	23.04.2027
