


3




Anschlusskanal Abwasserüberleitung

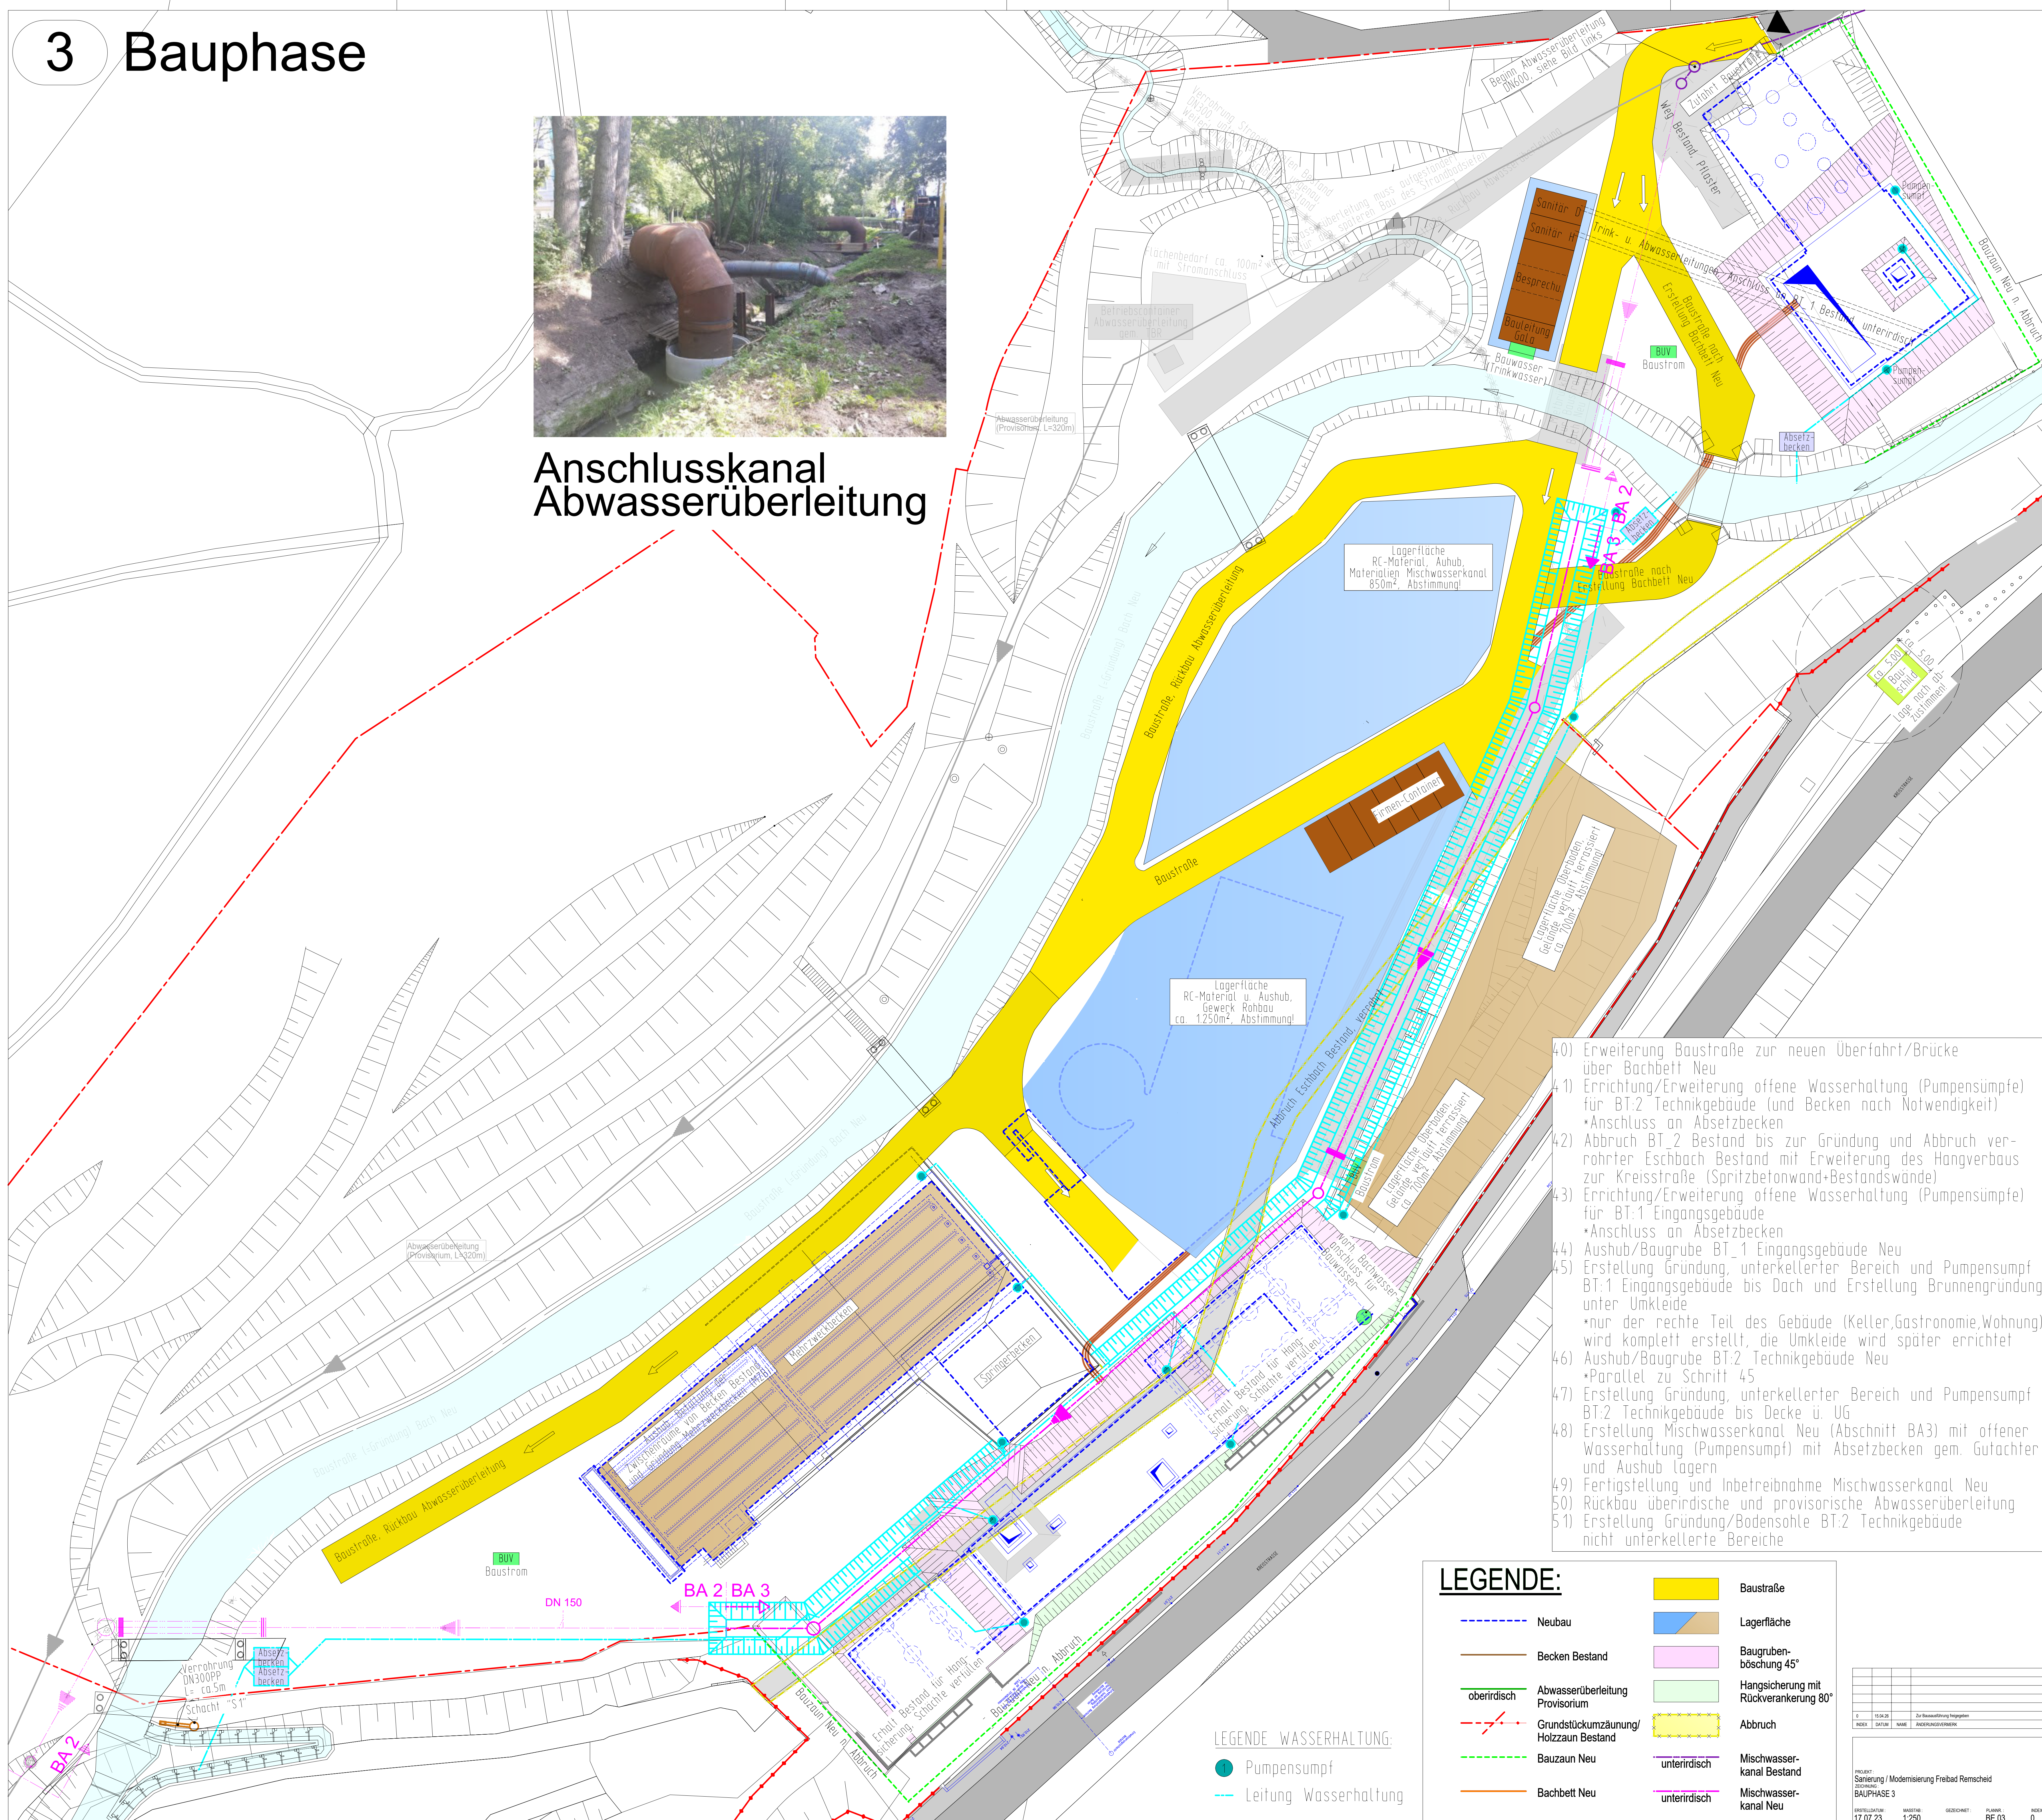

- 40) Erweiterung Baustraße zur neuen Überfahrt/Brücke über Bachbett Neu
- 41) Errichtung/Erweiterung offene Wasserhaltung (Pumpensümpfe) für BT:2 Technikgebäude (und Becken nach Notwendigkeit)
 - Anschluss an Absetzbecken
- 42) Abbruch BT_2 Bestand bis zur Gründung und Abbruch verrohrter Eschbach Bestand mit Erweiterung des Hangverbaus zur Kreisstraße (Spritzbetonwand+Bestandswände)
- 43) Errichtung/Erweiterung offene Wasserhaltung (Pumpensümpfe) für BT:1 Eingangsgebäude
 - Anschluss an Absetzbecken
- 44) Aushub/Baugrube BT_1 Eingangsgebäude Neu
- 45) Erstellung Gründung, unterkellertter Bereich und Pumpensumpf BT:1 Eingangsgebäude bis Dach und Erstellung Brunnengründung unter Umkleide
 - nur der rechte Teil des Gebäude (Keller,Gastronomie,Wohnung) wird komplett erstellt, die Umkleide wird später errichtet
- 46) Aushub/Baugrube BT:2 Technikgebäude Neu
 - Parallel zu Schritt 45
- 47) Erstellung Gründung, unterkellertter Bereich und Pumpensumpf BT:2 Technikgebäude bis Decke ü. UG
- 48) Erstellung Mischwasserkanal Neu (Abschnitt BA3) mit offener Wasserhaltung (Pumpensumpf) mit Absetzbecken gem. Gutachter und Aushub lagern
- 49) Fertigstellung und Inbetriebnahme Mischwasserkanal Neu
- 50) Rückbau überirdische und provisorische Abwasserüberleitung
- 51) Erstellung Gründung/Bodensohle BT:2 Technikgebäude nichtunterkellerte Bereiche

LEGENDE:

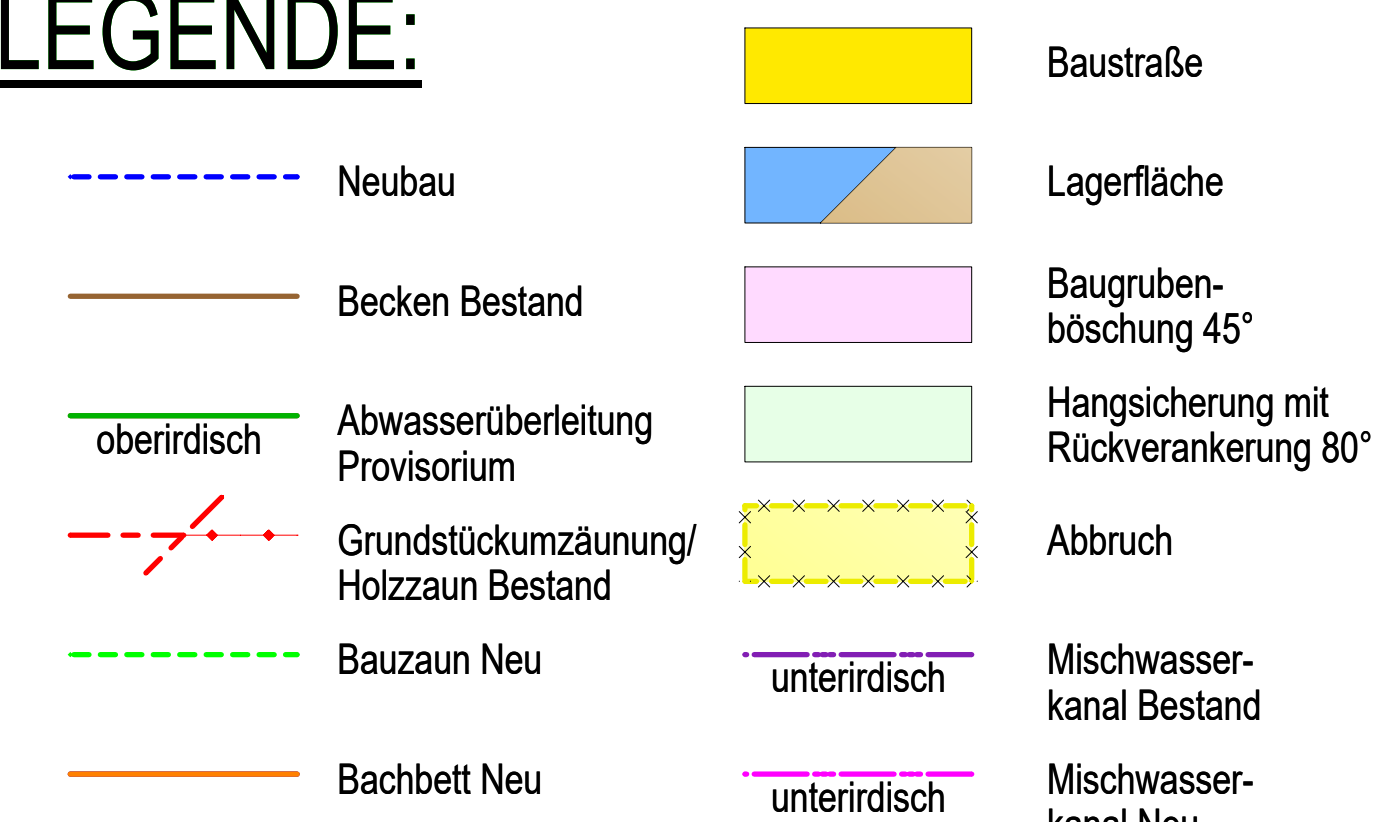

LEGENDE WASSERHALTUNG:

1 Pumpensumpf
Leitung Wasserhaltung

0	15.04.26		Zur Bauausführung freigegeben
INDEX	DATUM	NAMM	ÄNDERUNGSVERMERK
PROJEKT:			
Sanierung / Modernisierung Freibad Remscheid			
ZEICHNUNG:			
BAUPHASE 3			
ERSTELLEDATUM:	MASSTAB:	GEZEICHNET:	PUNKT:
17.07.23	1:250		RF 03
			NACH:
			0
